

# エナミック用バリア取替チェックシート

## (兼) 工事完了報告書

## 1. 開閉器の情報

	形 式	選択 ○	ヒューズ 定格電流	備 考
種類	PFS-201TM-R		G- A	形式の右の選択に○を 付けてください ヒューズの定格電流を 記入ください
	PFS-205TM-R		G- A	
	PFS-201TM-RS		G- A	
	PFS-205TM-RS		G- A	
製造年				西暦年号を記入ください
製造番号				製造番号を記入ください

## 2. 設置場所の情報

郵便番号	
住所	
会社名/事業所名	
電話番号	

## 3. 電気管理者様の情報

郵便番号	
住所	
会社名	
電話番号	
氏名	印

## 4. 工事者様の情報

工事完了日	20 年 月 日	
工事件名・工事内容	上記エナミックのバリア取替作業を完了したことを報告します。	
工事 完了証明	会社名	
	氏名	印
請番/アイテム (E)記載		

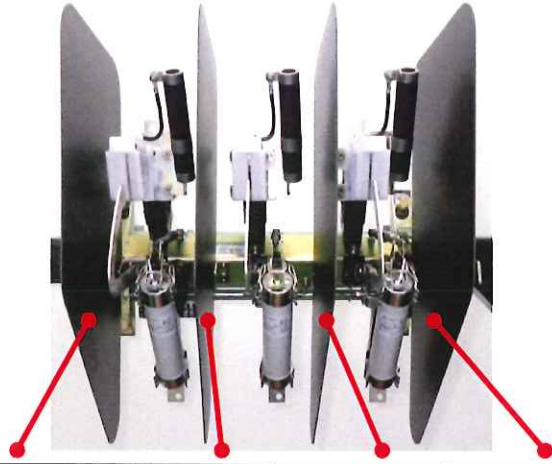
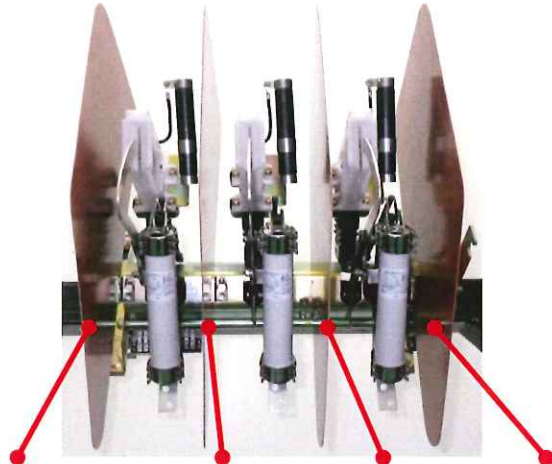
〈個人情報の取り扱いについて〉

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、本件の対応以外には使用いたしません。

これらの業務に携わる関係会社へも、お客様の個人情報を開示する事がありますが、弊社と同等の管理を実施いたしますので、あらかじめご了承くださいませよう願いたします。

5. チェックシート

作業日 : 20 年 月 日

	項 目	内 容				
作業前	停電作業で実施しましたか。	はい ・ いいえ				
	前面保護板（アクリル板）は取り外しましたか。	はい ・ いいえ				
	バリヤは 4 枚取り付けられていますか。	はい ・ いいえ				
取替前		取替前品のバリヤの反りを確認ください。いずれかに ○ を付けてください。  その他 特記事項等があれば下記に記入ください。				
	<table border="1"> <tr> <td>反り 有・無</td> <td>反り 有・無</td> <td>反り 有・無</td> <td>反り 有・無</td> </tr> </table>	反り 有・無	反り 有・無	反り 有・無	反り 有・無	
反り 有・無	反り 有・無	反り 有・無	反り 有・無			
取替後	バリヤは 4 枚取り付けられていますか。	はい ・ いいえ				
		バリヤが垂直に取り付いていることを確認ください。いずれかに ○ を付けてください。  その他 特記事項等があれば下記に記入ください。				
	<table border="1"> <tr> <td>傾き 有・無</td> <td>傾き 有・無</td> <td>傾き 有・無</td> <td>傾き 有・無</td> </tr> </table>	傾き 有・無	傾き 有・無	傾き 有・無	傾き 有・無	
傾き 有・無	傾き 有・無	傾き 有・無	傾き 有・無			
作業後	開閉器を入切操作し動作に異常は無いですか。	はい ・ いいえ				
	前面保護板（アクリル板）は元に戻しましたか。	はい ・ いいえ				
	工具・部品等の置き忘れ等は無いですか。	はい ・ いいえ				

以上で、エナミック用バリヤ取替作業は終了となります。ご協力ありがとうございました。  
 お手数ではございますが、同梱されている宅急便（着払）伝票を使用し①～③を同梱し下記の住所へ送付願います。

- ① 取り外されたバリヤ（4枚）
- ② エナミック用バリヤ取替チェックシート（兼）工事完了報告書（本紙：2枚）
- ③ 貴社請求書（一括請求の場合は除く）

＜送付先＞ 〒484-0000 愛知県犬山市字上小針1番地  
 エナジス産業株式会社 輸送課  
 TEL 0800-200-0440
